

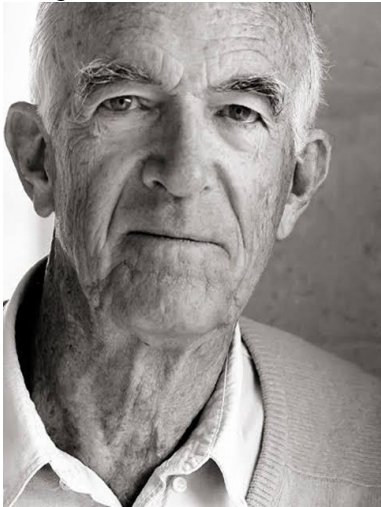



NOMBRE DEL MÓDULO	Gestión avanzada de la información
UNIDAD	Unidad 2. El riesgo en los proyectos
TÍTULO DEL VÍDEO	La historia de un gran fracaso

Sec	Acotaciones	Locución
1	Título: La historia de un gran fracaso	Quiero contarte la historia de un gran fracaso: la Ópera de Sídney. ¿Fracaso? Sí, escucha.
2	Imagen:  Arquitecto Jørn Utzon	Jørn Utzon quiso hacer algo muy especial: construir unas valvas curvas que parecerían alas. Sonaba bien, pero...
3	Imagen:  RÓTULOS: Escasa experiencia anterior Faltaban cálculos técnicos	...su <b>experiencia anterior era escasa</b> , por lo que en el diseño faltaban los cálculos técnicos necesarios para saber si podían construirse.
4	Imagen:  RÓTULOS: Acelerar la construcción Recortar los costes	A esta falta de planificación se unió el político de turno: por la proximidad de las elecciones, decidió que había que acelerar la construcción y recortar los costes, decisiones que suelen ser habituales en los proyectos (y desacertadas).
5	Imagen: RÓTULOS: El coste se disparó El plazo se alargó	El resultado fue que el coste se disparó y el plazo se alargó indefinidamente.

5b	 <p>Se destruyeron partes construidas</p>	<p>El dibujo de las valvas no podía trasladarse a la realidad, y hubo que replanificarlo, incluso <b>echando abajo partes ya construidas</b>.</p>
6	<p>Imagen:</p>  <p>RÓTULOS: Se sustituyó al arquitecto</p>	<p>El caos en el que se sumió el proyecto llegó a tal punto que <b>se sustituyó al arquitecto</b> en plena construcción.</p>
7	<p>Imagen:</p>  <p>RÓTULOS:</p>	<p>Jørn Utzon abandonó Australia con su familia y permaneció para siempre fuera de su país natal. Murió sin haber visto su principal obra.</p>
8	<p>Imagen:</p>  <p>RÓTULOS: El coste va más allá del dinero invertido</p>	<p>Este proyecto muestra el <b>altísimo coste</b> que puede tener un proyecto, que va mucho más allá del dinero invertido en él.</p>
